N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1		**Sous sprint 1**	**9 jours**	**Lun 24/02/2(**	**Ven 06/03/2(**		
2		Préaparation de l'utilisation des PS	8 jours	Lun 24/02/2(	Mer 04/03/2(		Farrouk
3		Ecrans du sous menu "Administration"	5 jours	Mer 26/02/2(	Mar 03/03/2(		François/Mylène
4		Maquette de l'écran "Contrôles" (non fonctionnelle)	2 jours	Mer 26/02/20	Jeu 27/02/20		François/Mylène
5		Activation du menu	1 jour	Mer 04/03/2(	Mer 04/03/2(	3	Mylène
6		Recette interne et corrections	1 jour	Jeu 05/03/20	Jeu 05/03/20	2;3;5;4	Carole
7		Livraison sous sprint1	0 jour	Ven 06/03/2(	Ven 06/03/2(	6	
8		**Sous sprint 2**	**15 jours**	**Lun 09/03/2(**	**Lun 30/03/2(**		
9		Traitement des retours client du sous-sprint	2 jours	Lun 09/03/2(	Mar 10/03/2(		Farrouk
10		Ecran "Contrôles" (sauf liste et modif en masse)	7 jours	Lun 09/03/20	Mar 17/03/20		François/Mylène
11		Ecran "Groupes" (sauf liste, modif en masse et écran "Contrôles" en popup)	5 jours	Mer 18/03/20	Mar 24/03/20	10	François/Mylène
12		Recette interne et corrections	3 jours	Mer 25/03/2(	Ven 27/03/2(	11	Carole
13		Livraison sous sprint2	0 jour	Lun 30/03/2(	Lun 30/03/2(	12	
14		**Sous sprint 3**	**12 jours**	**Lun 30/03/2(**	**Mer 15/04/2**		
15		Traitement des retours client du sous-sprint	2 jours	Mer 01/04/2(	Jeu 02/04/20		François/Mylène
16		2 (variantes d')écrans pour le menu "Plan de contrôle"	3 jours	Lun 30/03/20	Mer 01/04/20		Farrouk/Mylène
17		Ecran "Contrôle" : affichage en liste et modif en masse	3 jours	Jeu 02/04/20	Lun 06/04/20	16	Farrouk/Mylène



Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20


Tâche
Fractionnement
Jalon
Récapitulative
Récapitulatif du projet
Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif
Tâche manuelle
Durée uniquement
Report récapitulatif manuel
Récapitulatif manuel
Début uniquement
Fin uniquement
Tâches externes
Jalons externes
Échéance
Avancement
Progression manuelle

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
18		Ecran "Groupe" : affichage en liste et modif en masse	3 jours	Mar 07/04/20	Jeu 09/04/20	17	Farrouk/Mylène
19		Ecran "Groupe" : affichage écran "Contrôle" en popup	1 jour	Ven 03/04/20	Ven 03/04/20	15	François
20		Ecran "Contrôle" du menu "Suivi"	2 jours	Lun 06/04/2(	Mar 07/04/2(	19	Farrouk/Mylène
21		Recette interne et corrections	3 jours	Ven 10/04/2(	Mar 14/04/2(	18;20;16;17;1	Carole
22		Livraison sous sprint 3	0 jour	Mer 15/04/2(	Mer 15/04/2(	21	
23		**Sous sprint 4**	**4 jours**	**Lun 20/04/2(**	**Ven 24/04/2(**		
24		Traitement des retours client du sous-sprint	3 jours	Lun 20/04/2(	Mer 22/04/2(		Farrouk/Mylène
25		Recette interne et corrections	1 jour	Jeu 23/04/20	Jeu 23/04/20	24	Carole
26		Livraison sprint 2	0 jour	Ven 24/04/2(	Ven 24/04/2(	25	

14 16 18 20 22 24


Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20

Tâche	Récapitulatif inactif	Tâches externes
Fractionnement	Tâche manuelle	Jalons externes
Jalon	Durée uniquement	Échéance
Récapitulative	Report récapitulatif manuel	Avancement
Récapitulatif du projet	Récapitulatif manuel	Progression manuelle
Tâche inactive	Début uniquement	
Jalon inactif	Fin uniquement	

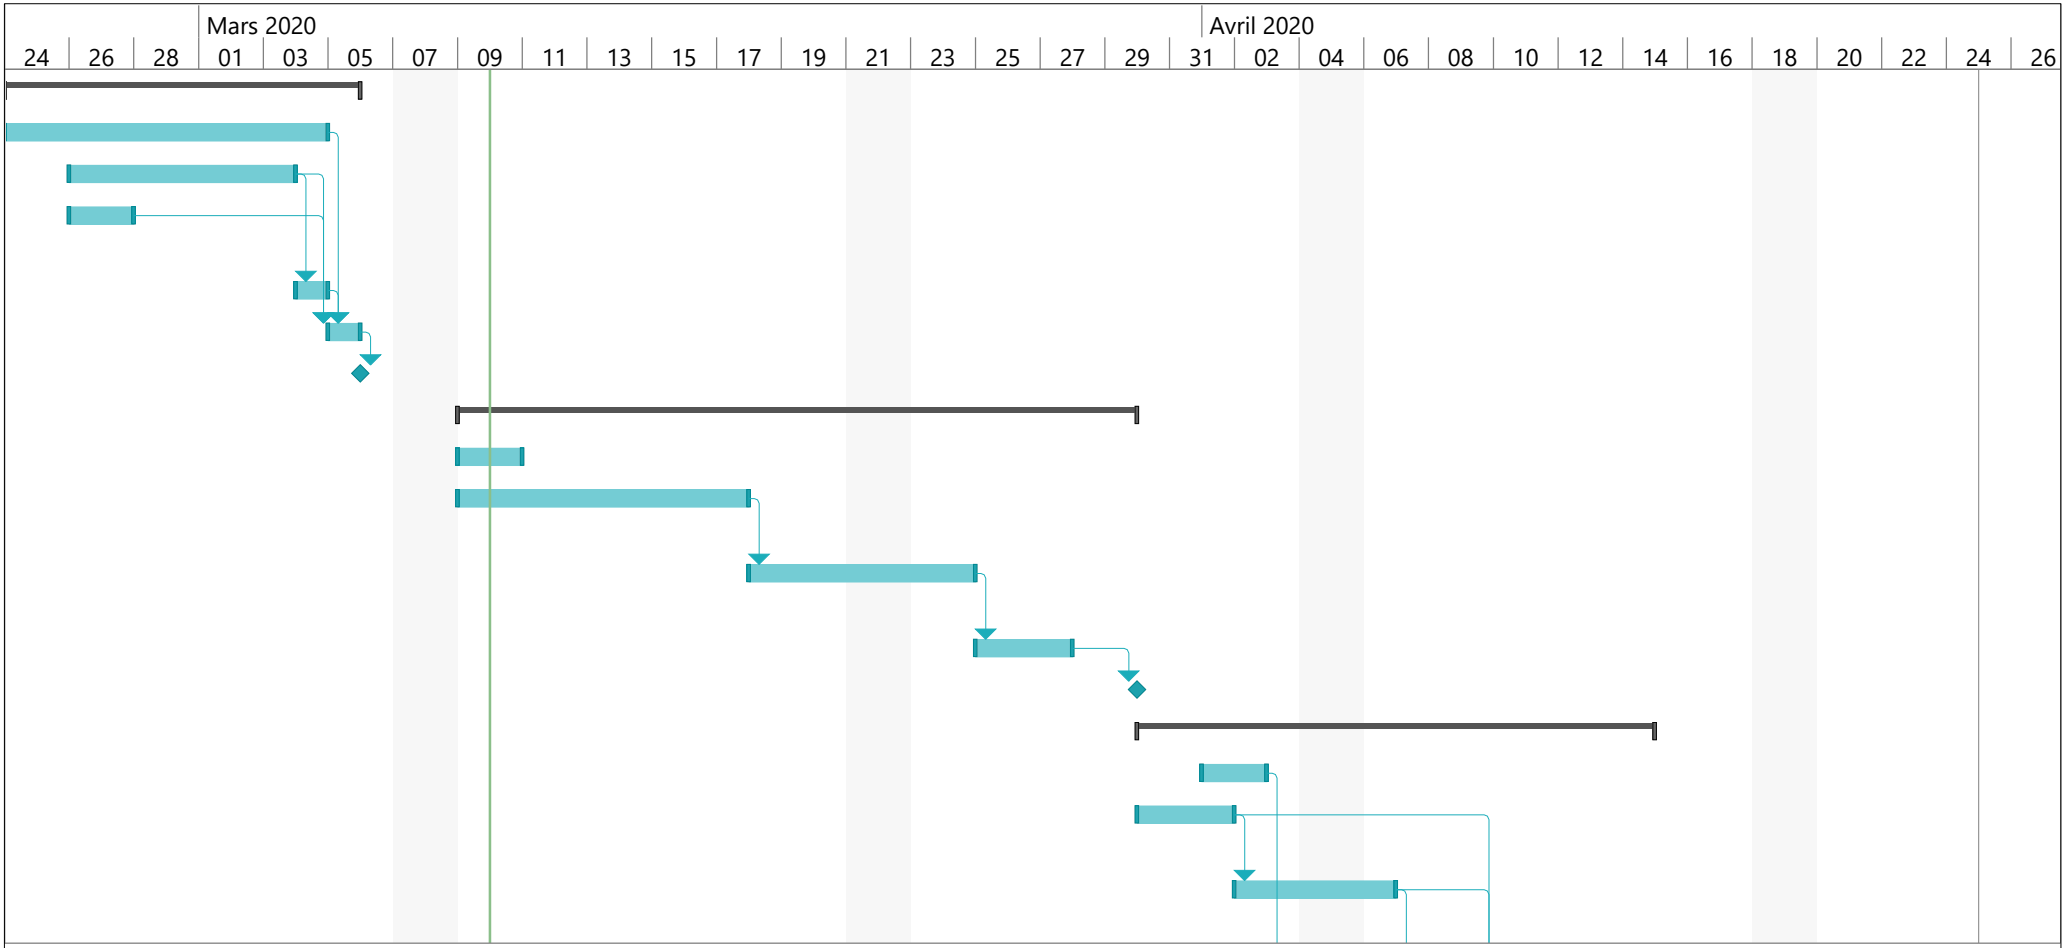

Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20

Tâche	Récapitulatif inactif	Tâches externes
Fractionnement	Tâche manuelle	Jalons externes
Jalon	Durée uniquement	Échéance
Récapitulative	Report récapitulatif manuel	Avancement
Récapitulatif du projet	Récapitulatif manuel	Progression manuelle
Tâche inactive	Début uniquement	
Jalon inactif	Fin uniquement	

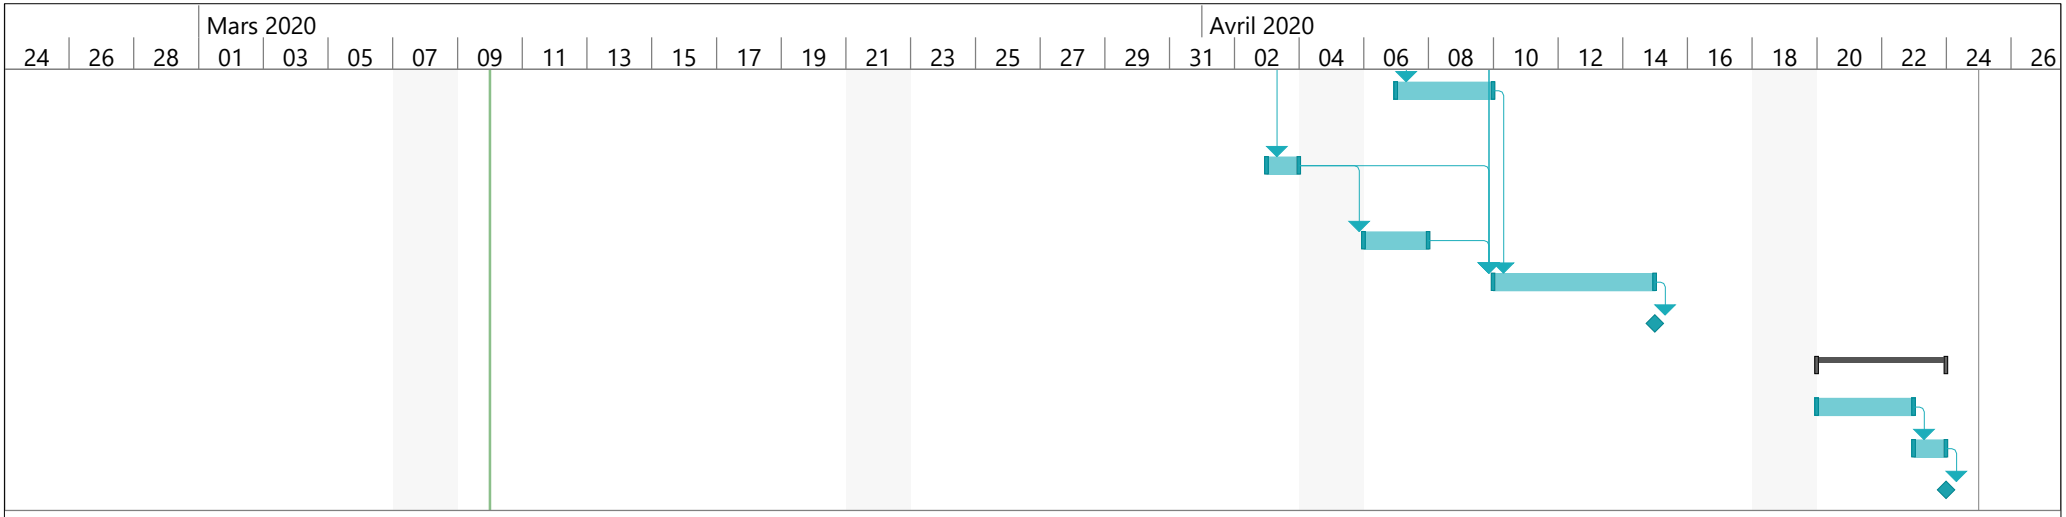


Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20

Tâche	Récapitulatif inactif	Tâches externes
Fractionnement	Tâche manuelle	Jalons externes
Jalon	Durée uniquement	Échéance
Récapitulative	Report récapitulatif manuel	Avancement
Récapitulatif du projet	Récapitulatif manuel	Progression manuelle
Tâche inactive	Début uniquement	
Jalon inactif	Fin uniquement	

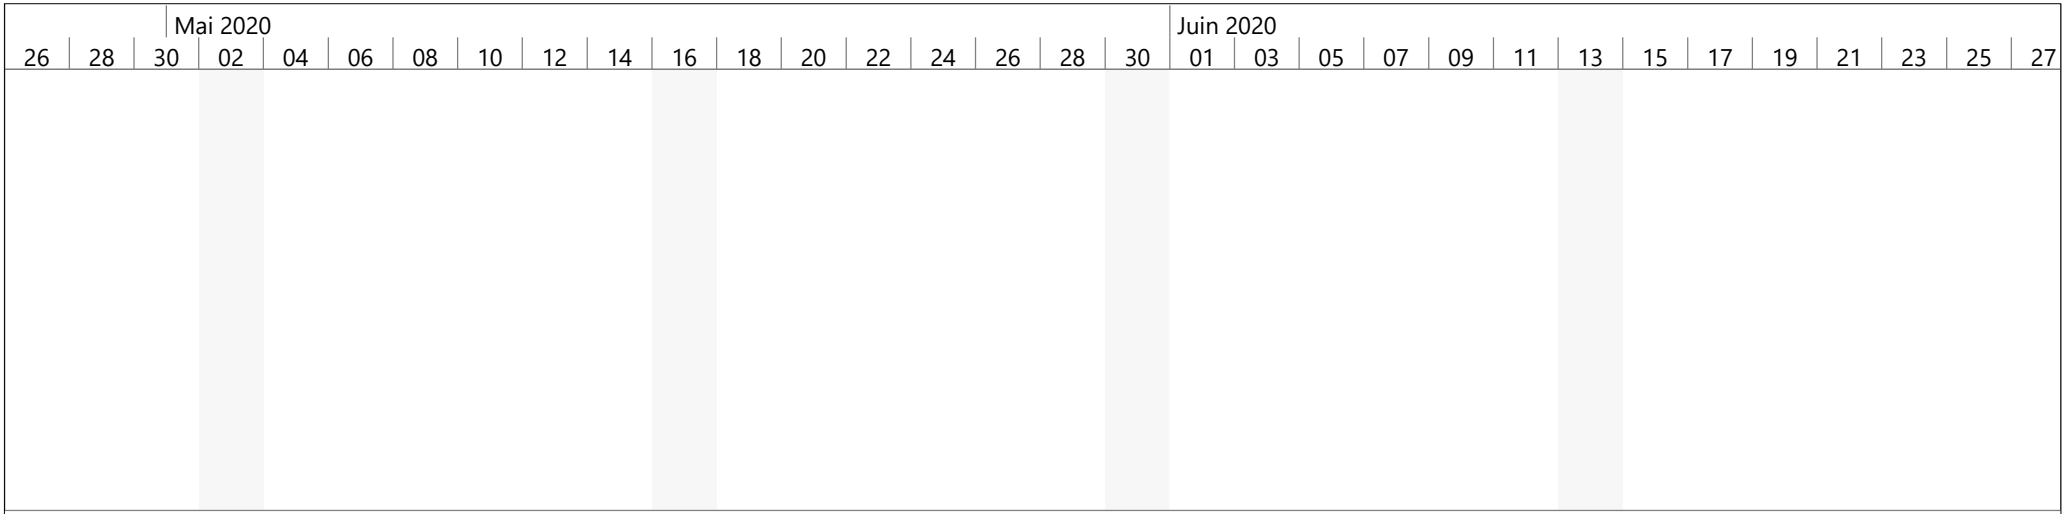

Projet : Planning_prévisionnel_
Date : Mar 10/03/20

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			
